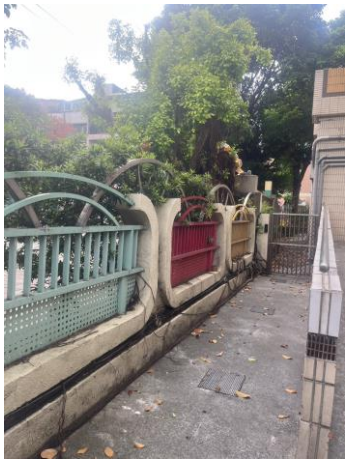
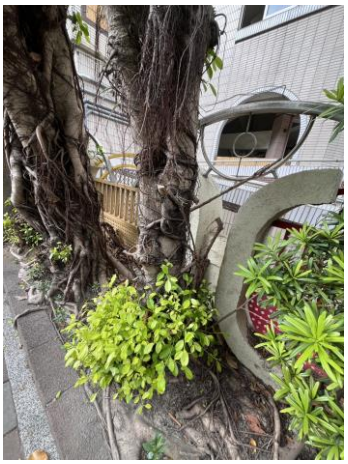
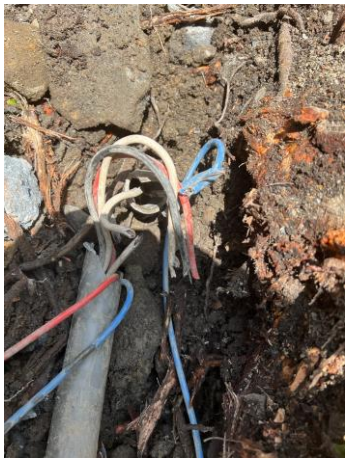
泰山區義學國小校園樹木會勘紀錄 115.10.08 下午 3:00

1. 校門警衛室後側圍牆現有榕樹因生長基地過小，緊靠圍牆，已造成圍牆崩裂，該處基地原有 8 株榕樹，部分因壓迫圍牆、警衛室及現有行道樹，已於日前進行修剪及部分移除，因現有圍牆規劃進行改建，該排榕樹現有生長基地過小，根系已嚴重影響現有圍牆結構，不適合現地保留。

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

2. 檢視115年6月25日會勘紀錄及樹木移除時的工作紀錄照片，該區樹木下方有現有不明管線，無法順利進行移除作業，現有保留之樹木因基地過小亦無法保留完整土球，考量施工移植困難度、樹木現有樹形結構及後續恢復狀況，建議採取移除作業。

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

3. 該區現有榕樹移除後，現有綠地建議在不影響人行道通行寬度，應重新規劃綠地範圍種植小喬木或灌木做為綠化補償作為。

4. 樹木移除作業應依照新北市樹木保護自治條例辦理。

許文輝

115.10.08
